


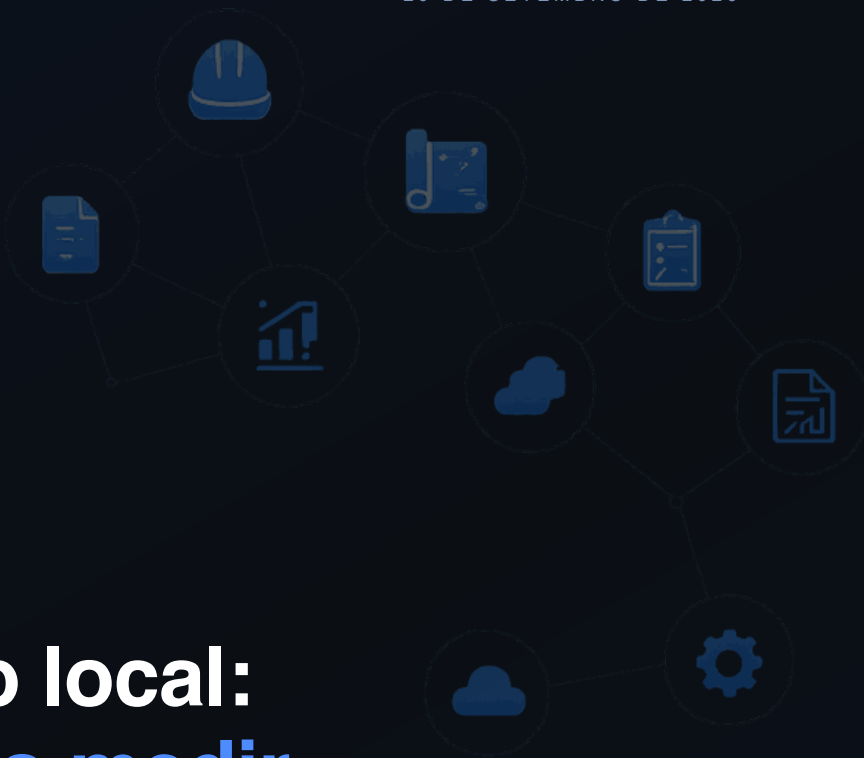

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Administração local: o que é e como medir

Custo direto discriminado na planilha, medido proporcionalmente ao avanço. Nunca valor mensal fixo.

ASSUNTOS

ADMINISTRAÇÃO LOCAL CANTEIRO DE OBRAS MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
CUSTO DIRETO MEDIÇÃO

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

A administração local reúne os custos da estrutura que gerencia a obra no canteiro: engenheiro residente, mestre, encarregados, técnico de segurança, apoio administrativo, veículos de serviço e o que mais for necessário para conduzir a execução.

Não é custo indireto, não é BDI e não é verba. **É custo direto, e vai discriminado na planilha orçamentária.**

Por que fica no custo direto

O TCU firmou o entendimento no Acórdão 2622/2013 do Plenário: os custos de administração local, canteiro de obras e mobilização e desmobilização devem estar discriminados na planilha de custos diretos por serem passíveis de identificação, mensuração e discriminação, além de estarem sujeitos a controle, medição e pagamento individualizados pela Administração.

A razão é a transparência do gasto público. Diluir esses custos dentro do BDI ou dentro dos preços unitários dos serviços esconde um valor que pode ser apurado item a item, e retira da fiscalização a capacidade de conferir o que está pagando.

O erro clássico: valor mensal fixo

Não se deve utilizar pagamento fixo mensal como critério de medição e pagamento de administração local, canteiro de obras e mobilização e desmobilização.

O motivo é direto. Quando o pagamento é mensal e fixo, ele deixa de ter relação com a obra e passa a ter relação com o calendário. Se a obra atrasa, a Administração continua pagando estrutura de canteiro por um avanço que não ocorreu, e o contrato desequilibra em favor de quem atrasou.

O critério correto

O critério objetivo é o **pagamento proporcional à execução financeira global da obra**, conforme indica o Acórdão 2622/2013 do Plenário.

Medindo assim, a administração local acompanha o avanço real. Obra que andou 40% remunerou 40% da estrutura de gerenciamento. Obra parada não gera medição de canteiro.

Quando a obra atrasa

O atraso muda quem paga, e a resposta depende da causa.

Atraso por culpa exclusiva da contratada. É indevido o acréscimo nos valores de administração local e de operação e manutenção do canteiro, conforme o Acórdão 178/2019 do Plenário. Quem deu causa ao atraso arca com o custo de permanecer mais tempo em obra.

Atraso por ação ou omissão da Administração. Cabe recomposição, mas não de tudo: apenas da parcela estritamente necessária à manutenção do canteiro, conforme o Acórdão 874/2018 do Plenário, além dos demais insumos efetivamente afetados.

A distinção importa na prática porque pedidos de reequilíbrio costumam vir com o valor mensal cheio, como se a obra parada mantivesse a mesma equipe mobilizada.

Como orçar

A administração local não se estima por percentual. Ela se monta.

O caminho é o **histograma**: definir a equipe de gerenciamento mês a mês, ao longo do cronograma, e multiplicar pelo custo de cada função com os encargos correspondentes. O mesmo vale para os veículos e para a estrutura do canteiro.

O demonstrativo detalhado dos custos com mobilização e desmobilização, administração local e instalação e manutenção do canteiro, baseado em histogramas de mão de obra e de equipamentos, é justamente o documento que sustenta o valor orçado e permite conferir o pedido de aditivo mais tarde.

Quando existe fonte de referência, as composições de administração local e canteiro podem ser buscadas no Sinapi e no Sicro, com os mesmos critérios de quantificação usados para os demais serviços.

Um argumento que não se aceita sozinho

Empresas apresentam, em disputa sobre preço, razões legítimas para ter administração local menor: obra na cidade sede da empresa, compartilhamento de estrutura com outras obras em andamento, ganho de escala na administração central.

Esses argumentos são admissíveis, mas precisam vir com evidência. Argumentação genérica, sem demonstração, não sustenta desconto nem justifica preço fora do referencial.

O que conferir

No orçamento. A administração local está discriminada em item próprio, ou embutida nos serviços? Existe histograma de equipe por trás do valor, ou é percentual arredondado?

No edital. O critério de medição está escrito, e é proporcional à execução financeira? Ou ficou como valor mensal?

Na medição. O percentual medido de administração local acompanha o percentual físico e financeiro da obra? Divergência crescente entre os dois é o primeiro sinal de que o critério não está sendo aplicado.

No aditivo. O pedido identifica a causa do atraso? Separa o que é manutenção necessária do que é equipe integral? Sem isso, o pleito não tem como ser analisado.

Veja também

TERMINOLOGIA

- Administração local
- Canteiro de obras
- Mobilização e desmobilização

ACÓRDÃOS

- Acórdão TCU 2622/2013
- Acórdão TCU 178/2019
- Acórdão TCU 874/2018

DOWNLOADS

- Cartilha TCU 2026 · critério de medição da administração local
- Cartilha TCU 2026 · como medir e pagar a administração local
